패키지시설사업 관리규정

방위사업청 훈령 제763호	2022. 12. 13. 제정
방위사업청 훈령 제868호	2024. 09. 10. 개정
방위사업청 훈령 제931호	2025. 12. 29. 개정
방위사업청 훈령 제979호	2026. 7. 30. 개정
방위사업청 훈령 제998호	2026. 11. 9. 개정

방 위 사 업 청

제1장 총 칙

제1조(목적)

제2조(정의)

제3조(적용범위)

제4조(업무분장)

제2장 중기계획 및 예산

제5조(중기계획)

제6조(예산편성)

제6조의2(신규사업 적정성 검토 절차)

제6조의3(설계용역의 통합 발주)

제3장 선행조치

제7조(부지매입 업무)

제8조(인·허가 등 대관협의 업무)

제9조(집행기관 선정)

제4장 연간 사업추진계획 수립

제10조(연간 사업추진계획 수립)

제5장 시설사업기본계획 수립 등

제11조(시설사업기본계획 수립)

제12조(시설사업기본계획 내용)

제13조(사업추진방안)

제14조(연구용역)

제15조(설계기본요구조건)

제6장 집행계획 작성

제16조(집행계획서 작성)

제17조(집행계획서 수정)

제7장 설계 및 공사관리

제18조(설계(단가) 적정성 검토)

제19조(설계변경)
제20조(집행진도 점검)
제21조(개별사업실무협의회 운영)
제22조(건설사업관리 등)
제8장 공사결과 조치 등
제23조(공사결과 조치)
제24조(예산결산)
제25조(재검토기한)

패키지시설사업 관리규정

방위사업청(방위사업분석과), 02-2079-6525

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 국방부 「국방전력발전업무훈령」, 방위사업청 「방위사업관리규정」을 근거로 방위력개선 시설사업의 업무수행에 필요한 방법 및 절차 등 필요한 사항 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "패키지시설사업"이란 무기체계와 연계하여 일괄 확보되어야 하는 방위력개선사업으로 추진되는 시설사업(방위력개선사업으로 추진되는 정보통신공사사업을 포함)으로, 시설은 전력화지원요소로서 무기체계의 운용·시험·훈련을 지원하거나 군수지원(저장·정비·보급)을 수행하는데 필요한 부동산 및 설비 등을 말한다.
2. "집행기관"이란 패키지시설사업을 시행하는 기관으로, 국방부(군사시설국)에서 선정한 국방시설본부, 국군지휘통신사령부 또는 각 군, 해병대를 말한다.
3. "소요제기기관"이란 각 군 및 해병대 등 패키지시설사업이 포함된 방위력개선사업의 소요를 제기하는 기관을 말한다.
4. "시설사업기본계획"이란 시설사업의 현황, 추진계획, 대관협의, 재원확보 등 업무수행을 합리적이고 경제적으로 수행하기 위한 기본계획을 말한다.
5. "설계기본요구조건"이란 건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면, 구조계산서, 시방서 등 공사에 필요한 서류의 작성근거가 되는 군 요구사항을 말한다.
6. "대관협의"란 시설사업과 관련된 인·허가를 받기 위해 해당 권한을 가진 기관과 인·허가에 필요한 사항을 협의하는 것을 말한다.
7. "집행계획서"란 국방중기계획 및 예산편성, 시설사업기본계획 등에 따라 작성된 시설사업 집행계획을 말한다.
8. "전문기관"이란 건축관련 학술정책연구, 컨설팅, 건축관련 기술서비스 등 관

련분야에 전문적인 지식과 경험을 갖춘 기관을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정에서 정하지 않은 사항은 건축 및 정보통신 관련 법규, 국방부 「국방전력발전업무훈령」, 「군 시설사업 관리훈령」에 따른다.

제4조(업무분장) 업무수행을 위한 관련기관의 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 국방부 군사시설국

가. 집행기관 선정

2. 방위사업청 방위사업정책국(이하, "방위사업정책국"이라 한다.)

가. 연간 사업추진계획 수립

나. 패키지시설사업 중기계획 및 예산 검토

다. 시설사업기본계획 및 집행계획서 검토

라. 시설사업 연구용역 예산 지원

마. 패키지시설사업 집행진도 점검

3. 방위사업청 통합사업관리팀(이하, "통합사업관리팀"이라 한다.)

가. 패키지시설사업 중기계획 및 예산편성요구서(안) 작성

나. 패키지시설사업 사업관리(연구용역관리 포함)

다. 시설사업기본계획 수립 및 집행계획 승인

라. 설계기본요구조건 검토 및 확정

4. 집행기관

가. 패키지시설사업 집행, 설계 및 공사관리

나. 패키지시설사업 중기계획 및 예산 검토

다. 시설사업기본계획 검토

라. 설계기본요구조건 검토

마. 단계별 집행계획서 작성

5. 소요제기기관

가. 패키지시설사업 중기계획 및 예산편성요구(안) 기초자료 제출

나. 시설사업기본계획 및 집행계획 검토

다. 비밀사업 여부, 방호등급 판단 및 탄약고 폭발물안전거리 충족 사전검토 등

라. 설계기본요구조건 작성 및 수정

마. 부지확보 및 사업여건 조성(토지소유권 확인, 사·공유지 사용동의서, 갈등 관리 및 주민설명회, 대안마련 등)

제2장 중기계획 및 예산

제5조(중기계획) ① 소요제기기관은 시설사업기본계획과 시설소요를 근거로 추가 식별한 소요를 포함한 중기계획 작성 자료를 「국방중기계획 작성지침」에서 정하는 기간까지 통합사업관리팀에 제출한다. 이때 소요제기기관은 방위력개선사업이 진행될 부대(부지)에 일반회계 및 특별회계(부대 이전·개편·토양정화 등)와 관련된 별도의 사업계획·진행·간섭 여부 사항을 각 군(공병실 등)에 확인하고, 중기대상 기간 중 F+2년도 신규 착수사업은 제6조의2 제1항에 따른 신규사업 적정성 검토를 실시하여 전력화지연 유발 요인이 있는지 사전 확인한 결과를 포함하여 제출하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 소요제기기관으로부터 확인된 패키지 시설소요를 검토 후 방위사업정책국과 협의하여 중기계획요구서(안)에 반영하고 기획조정관에게 제출한다. 이때, F+2년도 신규 착수사업은 시설소요에 대한 구체적인 사업설명서(별지 제1호서식), 중기계획 기본요구서(별지 제2호서식) 등을 포함하는 사업계획서를 작성하여 제출한다.

제6조(예산편성) ① 집행기관 및 소요제기기관은 시설소요에 대한 예산편성 요구자료를 「국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」에서 정하는 기한까지 통합사업관리팀에 제출한다. 이때 F+1년도에 착수하는 신규사업의 경우, 소요제기기관은 제6조의2 제1항에 따른 신규사업 적정성 검토를 실시하고 그 결과를 포함한 예산편성 요구자료를 통합사업관리팀에 제출하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 집행기관 및 소요제기기관으로부터 확인된 패키지 시설소요를 검토 후 방위.사업정책국과 협의하여 예산편성요구서(안)에 반영하고

기획조정관에게 제출한다.

③ 통합사업관리팀장은 제2항에 따른 예산편성요구서(안)를 검토할 때 부대별 대관협의, 부지확보 등 선행조치의 이행 여부 및 완료 예상시기, 설계·공사 착수 가능시기, 주장비 전력화 일정 등을 확인하여 당해연도 실집행 가능성을 확인하여야 한다.

④ 통합사업관리팀장은 제3항에 따른 검토 결과 선행조치가 완료되고 당해연도 중 공사 착수 및 예산 집행이 가능한 사업은 실집행 가능액을 고려하여 공사비를 반영하고, 선행조치 미완료 등으로 당해연도 중 공사 착수가 곤란한 사업은 설계비·조사비 등 당해연도에 실제 집행 가능한 예산을 패키지시설사업 추진 단계를 고려하여 반영한다.

⑤ 통합사업관리팀장은 하나의 패키지시설사업에 둘 이상의 부대가 포함된 경우에는 일부 사업의 선행조치 미완료 여부를 이유로 다른 부대의 공사비 반영을 일률적으로 제한하지 아니하고, 부대별 실집행 가능성을 구분하여 예산반영 여부 및 규모를 검토하여 제2항에 따라 조치한다.

⑥ 제4항에도 불구하고 선행조치가 완료되지 아니한 사업이라도 완료 예상시기가 객관적으로 확인되고, 당해연도 중 공사 착수 및 예산 집행이 가능하며, 주장비 전력화 일정상 조기 예산반영이 필요한 경우에는 예상 실집행 가능액의 범위에서 공사비를 반영할 수 있다.

제6조의2(신규사업 적정성 검토 절차) ① 예산을 효율적으로 집행하고 패키지시설을 적기에 확보하기 위해, 소요제기기관은 신규사업 적정성 검토(별지 제5호서식)를 시행하여 패키지시설사업 집행에 필요한 사항 및 추진 가능 여부를 확인하여야 한다.

② 소요제기기관은 중기계획 및 예산편성요구자료 작성시 신규사업 적정성 검토를 실시하고, 그 결과를「국방중기계획 작성지침」과「국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」에서 정하는 기한 내 통합사업관리팀에 제출하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 기한 내 서류를 제출하지 못할 경우 통합사업관리팀과 협의하여 기한을 연장할 수 있다.

③ 통합사업관리팀이 중기계획요구서 제출시 신규사업 적정성 검토결과 적정한 것으로 판단한 사업은 F+1년도 예산편성시 신규사업 적정성 검토를 생략할 수 있다. 다만, 이후 사업부지 변경 등에 따라 사업계획이 변경된 경우에는 F+1년도 예산편성시 신규사업 적정성 검토를 다시 실시하여야 한다.

④ 통합사업관리팀은 신규사업 적정성 검토 결과 집행 가능성이 미흡한 경우 소요제기기관에 보완을 요구할 수 있다. 다만, 보완이 불가하다고 판단될 경우에는 사업부지 변경 등을 요청할 수 있다.

제6조의3(설계용역의 통합 발주) ① 패키지시설사업에 둘 이상의 부대가 포함되나 이를 하나의 설계용역으로 통합하여 발주하려는 경우, 집행기관은 부대별 대관협의 진행상황, 설계 착수 및 완료 가능시기 등을 사전에 검토하고, 일부 사업의 지연이 다른 사업의 설계완료 및 공사착수에 영향을 미치지 않도록 사업별 독립적인 공정관리 방안을 수립하여야 한다.

② 집행기관은 제1항에 따라 설계용역을 통합발주하는 경우 과업지시서 및 계약조건 등에 부대별 착수·중지·재개 및 정산에 관한 사항 등을 구분하여 명시하여야 한다.

③ 집행기관은 대관협의 장기화 등으로 제1항에 따른 부대별 독립적인 사업관리가 곤란하여 다른 사업의 설계 또는 공사 일정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 해당 사업을 분리하여 발주하여야 한다.

제3장 선행조치

제7조(부지매입 업무) 소요제기기관은 시설소요 제기 전 인·허가에 문제가 없는 사업부지를 명확히 지정하고, 토지소유자 현황을 확인하여 국·공유지, 사유지 등 국방부 소유가 아닌 토지는 매입·사용동의 등을 통해 토지 사용에 대한 조치를 완료한 이후 시설소요를 제기하여야 한다. 다만, 사업계획 승인 후 부지매입이 가능한 대형사업의 경우는 매입계획을 포함하여 소요를 제기하되, 통합사업관리팀장은 초년도 예산에 부지매입과 관련된 비용만 편성하고, 국방시설본부는 제4조 제5호마목에도 불구하고 부지매입 업무를 수행한다.

제8조(인·허가 등 대관협의 업무) ① 소요제기 이후 인·허가 등 대관협의는 시설사업 전단계(설계전, 설계/공사 중)에 걸쳐 집행기관에서 수행한다. 다만, 장시간 소요되고 설계 전에 반영·변경이 필요한 개발제한구역 관리계획, 공유

수면매립 기본계획, 도시·군관리계획에 관한 사항은 소요제기기관에서 수행하여야 한다.

② 집행기관은 대관협의 필요사항을 검토하고, 기본 및 실시설계 용역 전에 대관협의를 위한 기본조사용역이 필요한 경우 별도로 추진할 수 있으며, 기본조사 용역을 수행하기 위한 집행계획서(안)을 통합사업관리팀에 제출하여야 한다.

제9조(집행기관 선정) ① 통합사업관리팀장은 시설사업기본계획 수립 전에 소요제기기관과 협의하여 국방부(군사시설국)에 집행기관 선정을 의뢰한다. 다만, 정보통신공사사업 중 방위사업청에서 직접 수행하는 경우에는 제외한다.

② 국방부(군사시설국)은 집행기관을 선정하여 방위사업청 및 선정기관에 통보한다.

제4장 연간 사업추진계획 수립

제10조(연간 사업추진계획 수립) ① 방위사업정책국장은 매년 말 다음 각 호의 내용이 포함된 패키지시설사업의 다음연도 개별사업 추진계획을 수립하여 집행기관에 통보한다.

1. 주장비 사업개요 및 추진경위
2. 패키지시설소요 및 근거, 추진경위
3. 단계별 추진계획 작성 필요내용(단위시설 목록, 규모, 예산)
4. 패키지시설 향후 추진일정(주장비 사업일정과 비교) 및 예산집행계획 등

② 방위사업정책국장은 연간 사업추진계획 수립에 필요한 지원을 통합사업관리팀에 요청할 수 있다.

제5장 시설사업기본계획 수립 등

제11조(시설사업기본계획 수립) ① 통합사업관리팀장은 사업추진기본전략(안) 수립 시에 패키지시설의 시설개요, 소요예산 등 개략계획을 포함하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 설계착수 2년 전까지 국방부, 방위사업정책국, 집행기관, 소요제기기관의 검토를 거쳐 시설사업기본계획을 수립하고 관련기관에 통보한다.

③ 통합사업관리팀장은 시설사업기본계획을 수립 시 국방부·합참·집행기관·소요제기기관·전문기관에 필요한 지원을 요청하거나, 전문기관에 연구용역을 의뢰할 수 있다.

④ 소요제기기관은 비밀사업 여부, 방호등급 판단 및 탄약고 폭발물안전거리 충족여부 등을 시설사업기본계획 작성 단계에서 검토·적용할 수 있도록 하여야 하며, 비밀사업은 국군방첩사령부로부터 발급받은 비밀사업확인서를 함께 통합사업관리팀에 제출하여야 한다.

⑤ 통합사업관리팀장은 시설사업기본계획 수립 후 사업규모, 총사업비, 사업기간 등을 기획재정부와 협의한다.

⑥ 시설사업기본계획 수립과 관련된 업무절차는 별표 1과 같으며, 시설사업기본계획을 수정하거나 폐지하는 경우에도 이와 같다.

제12조(시설사업기본계획 내용) ① 시설사업기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 「건설기술진흥법」 시행령 제69조에 따른 ‘건설공사기본계획’ 포함 내용
2. 시설규모 및 면적, 요구조건의 적정성 검토
3. 공사예정지와 해당부대의 공사여건 분석
4. 대관협의 필요사항에 대한 조치계획
5. 사업추진방안 및 사업추진 일정(대관협의, 계약행정 일정 등 포함)
6. 사업에 포함된 장비, 물자, 방호시설 등의 확보방안
7. 사업추진 간 발생할 수 있는 예상 문제점 및 조치방안
8. 유지관리 및 환경보전계획
9. 총사업비
10. 통합사업관리팀 구성(안)
11. 관련기관의 의견 등

② 시설사업기본계획은 별지 제3호서식을 참고하여 작성한다.

제13조(사업추진방안) ① 패키지시설사업의 사업추진방안은 시설사업기본계획 수립 단계에서 통합사업관리팀, 집행기관, 소요제기기관이 협의하여 결정한다.

② 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제79조에 따른 대형공사는 국방부 「특별건설기술심의위원회 운영 및 시공 등 평가훈령」 및 국토해양부 고시 「대형공사 등의 입찰방법 심의기준」에 따라 집행방법 심의를 거쳐 입찰방법을 결정한 후 시행한다.

제14조(연구용역) ① 제11조 제3항의 시설사업기본계획 수립, 사업추진간 발생한 제한사항 검토 등 연구용역 예산은 통합사업관리팀이 확보하여야 한다. 다만, 연구용역이 필요함에도 예산이 반영되지 않아 용역을 착수할 수 없는 경우에는 방위사업정책국에 예산지원을 요청할 수 있다.

② 방위사업정책국장은 사업 우선순위 등을 고려하여 확보된 예산범위 내에서 지원할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 중기계획 제출 시 해당기간에 대한 연구용역 소요를 포함하여 방위사업정책국에 제출하여야 한다.

④ 소요제기기관은 시설사업기본계획 수립을 위한 연구용역 수행 단계에서 설계기본요구조건(초안)을 다음 각 호를 고려하여 통합사업관리팀에 제출하여야 한다.

1. 주장비 적기 운용가능성
2. 부대이전 관련사항
3. 「국방·군사시설기준」 부합여부
4. 그 밖에 관련 법령, 훈령 및 지침과의 부합 여부, 인·허가사항 저촉 여부

제15조(설계기본요구조건) ① 소요제기기관은 통합사업관리팀의 시설사업기본계획 수립 결과를 반영한 설계기본요구조건(안)을 작성하여 통합사업관리팀에 제출한다.

② 통합사업관리팀장은 설계기본요구조건(안)이 시설사업기본계획의 업무 및 예산범위에 해당하는지 확인 후 집행기관에 통보한다.

③ 집행기관은 통합사업관리팀장과 협의하여 제14조 제4항의 각 호를 검토하고, 그 결과를 설계착수 일정에 따라 통합사업관리팀에 제출한다.

④ 통합사업관리팀장은 원칙적으로 연구개발사업의 경우에는 기본설계검토결과 확정 후부터 상세설계검토 종료일(최종 회의 결과 통보 시점) 이후 6개월까지의 기간 동안, 구매사업의 경우에는 구매계획 승인 후부터 대상장비 선정 이후 6개월까지의 기간 동안 설계기본요구조건(안)을 검토·확정하여 설계가 착수될 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 사업의 특성과 추진 여건을 고려하여 설계기본요구조건(안) 검토·확정시기를 조정할 수 있다.

⑤ 설계기본요구조건과 관련된 업무절차는 별표 2와 같고 별지 제4호서식을 참고하여 작성한다.

⑥ 「산업안전보건법」 제67조, 같은 법 시행령 제55조에 따른 기본안전보건대장 작성과 관련한 사항은 「군 시설사업관리훈령」을 따른다.

제6장 집행계획 작성

제16조(집행계획서 작성) ① 집행기관은 국방중기계획 및 예산편성, 시설사업기본계획 등에 따라 패키지시설사업 단계별(기본조사, 부지매입, 기본 및 실시설계, 시설공사) 집행계획서(안)를 작성하여 통합사업관리팀에 제출한다. 다만, 수 개의 단계가 유사한 시기에 착수 또는 종료되거나 단계 간 집행결과의 확인이 불필요한 경우 등에는 수 개의 단계를 통합하여 집행계획서(안)를 작성할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 집행계획서(안)를 검토 및 승인 후 집행기관에 통보한다.

③ 통합사업관리팀장은 집행계획서 검토를 위해 필요시 방위사업정책국, 집행기관 및 소요제기기관과 협조하여 현장을 확인할 수 있다.

④ 집행계획 승인과 관련된 업무절차는 별표 3과 같다.

제17조(집행계획서 수정) ① 집행기관은 사업추진 중 승인된 집행계획서의 사업기간 변경, 예산증액 등이 필요한 경우 통합사업관리팀에 집행계획서 수정(안)을 제출한다.

② 통합사업관리팀장은 집행기관의 수정 요청사항에 대해 예산확보 및 집행가

능성을 검토 및 승인 후 집행기관에 통보한다.

③ 통합사업관리팀장은 집행계획서 수정에 따른 예산증감 및 예산의 이용·전용 소요가 발생할 경우 그에 따른 조치를 한다.

제7장 설계 및 공사집행 관리

제18조 (설계(단가) 적정성 검토) ① 집행기관은 패키지시설사업 중 「국방사업 총사업비 관리지침」 제3조에 해당하는 시설사업에 대해서는 설계 용역 중 조달청장에게 설계의 적정성(30%, 60%, 90%설계)과 단가(90%설계)의 적정성 검토를 의뢰한다. 통합사업관리팀장은 예산편성 시 조달청에 적정성 검토 의뢰를 위해 발생하는 수수료를(시설부대비) 반영한다.

② 제1항에도 불구하고 집행기관은 기획예산처훈령「총사업비 관리지침」제57조 제3항 단서에 따라 「건설기술진흥법」제6조에 따른 기술자문위원회의 자문을 거쳐 계획설계를 작성한 경우에는 조달청장에게 해당 계획설계의 적정성 검토를 의뢰하지 아니할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 조달청 설계(단가)의 적정성 검토결과에 따라 총사업비 조정이 필요한 경우 기획재정부와 협의한다.

제19조(설계변경) ① 설계변경은 설계 시 예측하지 못했던 사항 및 현장상태의 변화 등으로 설계를 변경할 필요가 있다고 인정되는 다음 각 호에 해당하는 경우에 한한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 시설물의 원 기능이 보장되지 않아 정상적인 사용이 불가능한 경우
3. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 집행계획의 변경으로 설계변경이 필요한 경우
5. 안전상 문제점 발생이 예상되거나 유지관리 간 과다한 예산소요가 예상되는 경우

② 집행기관은 설계변경이 발생할 경우 별표 4의 설계변경 절차에 따라 심의하고 승인한다.

③ 통합사업관리팀장은 제21조에 따른 개별사업실무위원회에 참여하여 추가예산 확보여부 등 의견을 제시하여야 하며, 설계변경에 따른 집행계획서 수정은 제17조 절차를 따른다.

제20조(집행진도 점검) ① 통합사업관리팀장은 다음 각 호의 사항을 집행기관 등으로부터 제출받아 주기적으로 사업추진현황을 점검하고 방위사업정책국에서 집행진도 점검을 위한 자료요청 시 제출하여야 한다.

1. 설계, 공사 추진일정 및 사업집행 실적
2. 설계 및 공사 변경사항(담당자 변경 포함)
3. 공사준공 결과
4. 부지매입 및 공사 관련한 민원사항 등

② 방위사업정책국장은 집행진도 및 사업집행실적을 분기별로 점검하고 관련기관(통합사업관리팀, 집행기관, 소요제기기관)과 협조하여 적기 준공 또는 예산관련 문제점 및 애로사항 등에 대한 해결방안을 수립하고 조치하여야 한다.

③ 방위사업정책국장은 전년도 패키지시설사업을 대상으로 예산집행 결과를 분석하고 집행이 부진한 사유에 대해서는 예방대책을 수립하고 조치하여야 한다.

④ 방위사업정책국장은 통합사업관리팀이 계획수립, 집행관리 시 활용할 수 있도록 매뉴얼 또는 체크리스트를 작성·제공할 수 있다.

제21조(개별사업실무협의회 운영) ① 집행기관은 패키지시설사업 진행 간에 효율적인 업무협력과 원활한 사업관리를 위해 방위사업청, 집행기관, 소요제기기관, 설계·시공회사 등이 참여하는 개별사업실무협의회를 운영한다.

② 통합사업관리팀장은 설계단계 착수회의, 30%, 60%, 90% 설계 완료 시(다만, 설계기간이 3개월 미만인 경우는 30%·60%, 6개월 미만인 경우는 60% 단계 생략 가능) 개별사업 실무협의회에 참여하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 사업담당자가 대리 수행할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 개별사업 실무협의회에서 다음 각 호의 사항에 대해

협의·조정을 요구할 수 있다.

1. 총사업비 및 예산집행 관련 사항
2. 설계변경 관련 사항
3. 공정계획 및 사업추진 일정에 관한 사항
4. 기타 원활한 사업관리를 위하여 필요한 사항

제22조(건설사업관리 등) ① 집행기관은 「건설기술진흥법」제39조 및 같은 법 시행령 제55조, 제57조의 설계 및 시설공사를 대상으로 사업의 효율성, 신뢰성, 품질확보 등 향상을 위해 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 실시하게 할 수 있다.

② 집행기관은 건설사업관리용역에 해당되는 시설공사가 아니더라도 집행기관의 감독 능력 및 공사 특성에 따라 용역이 필요하다고 인정되는 경우 총사업비 범위 내에서 시행 할 수 있다.

③ 건설사업관리용역 계약은 공사계약 이전에 체결하고 준공 후 건설사업관리를 위해 계약종료를 공사기간 이후로 한다.

④ 패키지시설사업 간 안전·품질 등 확보를 위해 건설사업관리가 원활히 시행, 지속되도록 통합사업관리팀 및 집행기관이 협력하여야 한다.

⑤ 기타 건설사업관리 집행에 관한 세부사항은 국토교통부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따른다.

⑥ 정보통신공사사업의 감리업무에 대해서는 통합사업관리팀장 또는 집행기관은 「정보통신공사업법 시행령」 제8조부터 제10조까지의 규정에 따른다.

제8장 공사결과 조치 등

제23조(공사결과 조치) ① 집행기관은 공사준공 후 1개월 이내에 준공검사 결과를 통합사업관리팀으로 제출하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 준공 완료된 사업에 대하여 집행기관 및 소요제기기관과 협의하여 현장확인을 할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 공사 집행결과를 토대로 예산 사용결과가 포함된 사업종결보고서를 작성 후 집행기관 및 방위사업정책국에 통보하여야 한다.

제24조(예산결산) 집행기관, 소요제기기관은 국회 및 기획재정부 등과의 패키지 시설사업 예산결산활동에 있어 통합사업관리팀장 요청 시 적극 협조하여야 한다.

제25조(재검토기한) 방위사업청장은 이 훈령에 대해 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일을 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제763호, 2022. 12. 13.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제931호, 2025. 12. 29.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제979호, 2026. 07. 30.>


제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제998호, 2026. 11. 09..>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.


[별표 1]

시설사업기본계획 수립(수정·폐지) 업무절차(제11조)

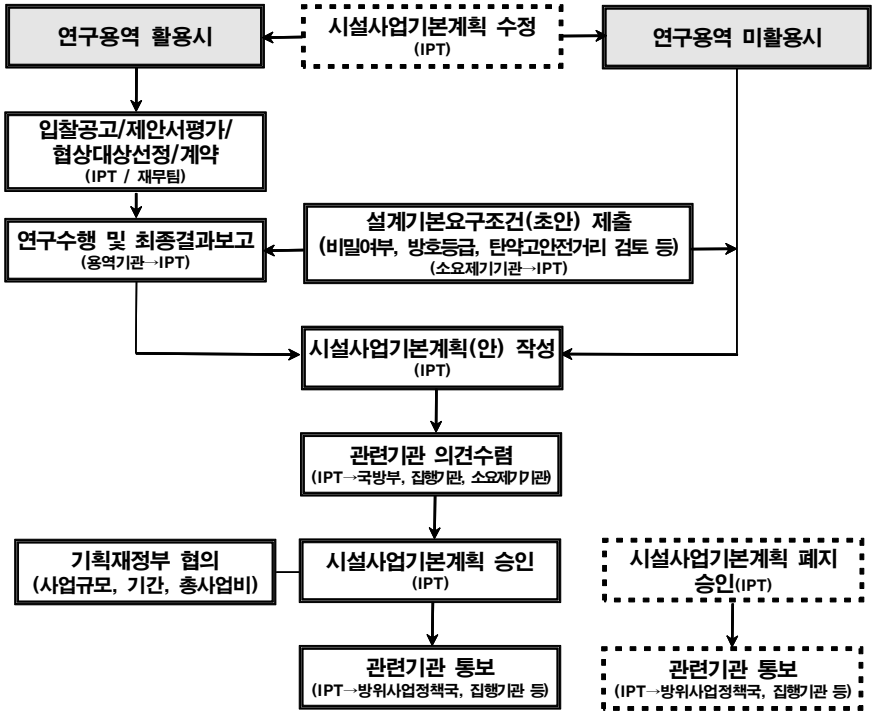


[별표 2]

설계기본요구조건 확정 업무절차(제15조)

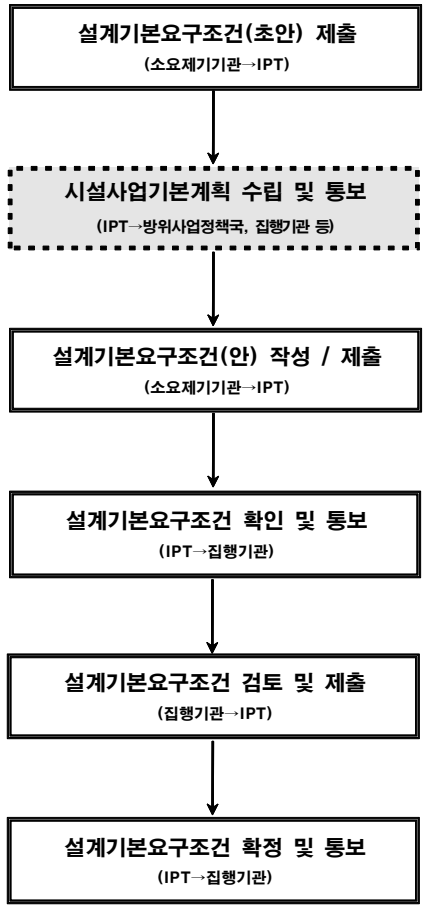


[별표 3]

집행계획 승인 업무절차(제16조)

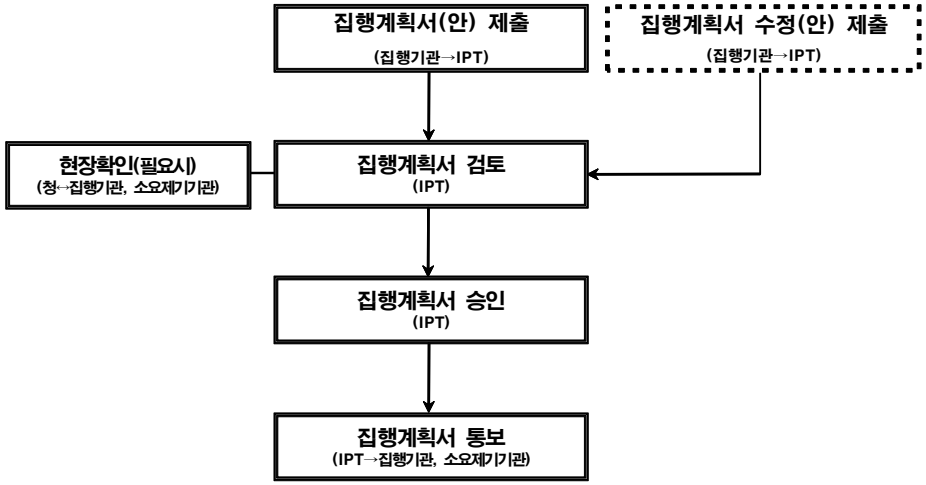

[별표 4]

설계변경 절차(제19조)

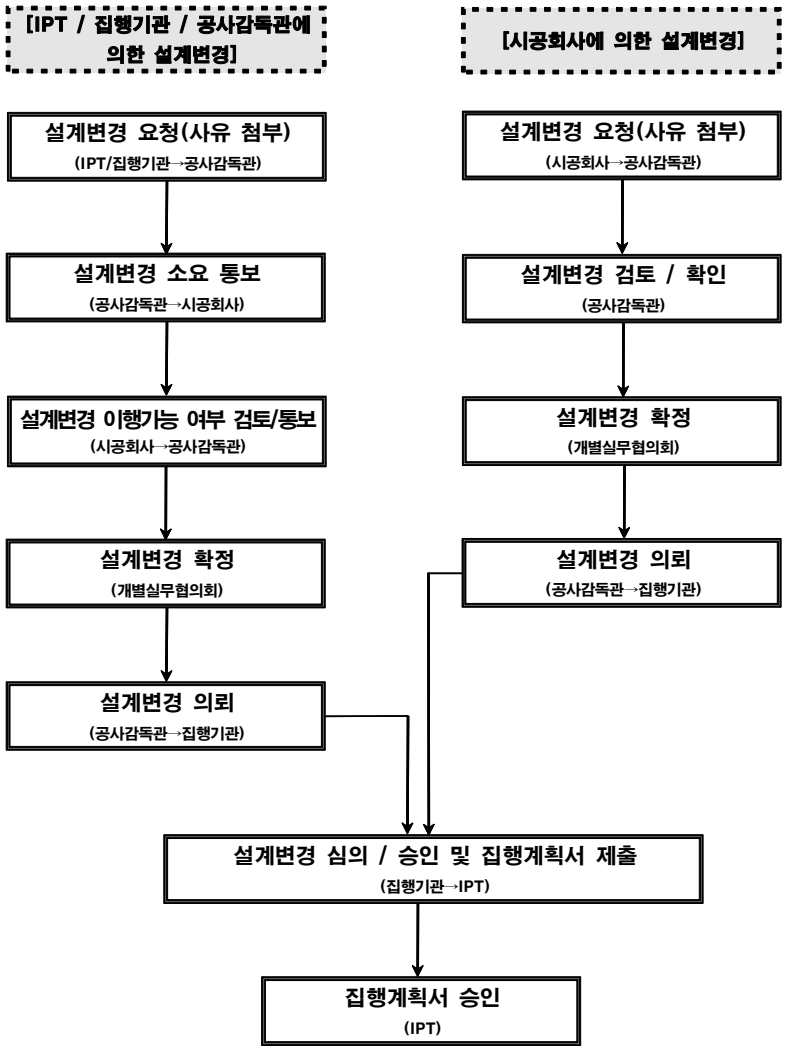

[별지 제1호 서식]

사 업 설 명 서

(사업명 :)

1. 사업개요

- 사업내용 요약, 공사위치(지번), 국방개혁상 개편 대상 여부

2. 현실태/ 문제점

- 기존건물 일반현황(신축년도 · 연면적 · 층수 등), 안전진단 결과, 이용실태 등
- 사업의 필요성(기존건물 노후, 병력증원 혹은 신규 무기체계 도입 등)

3. F+1년 예산(안) 산출내역

(단위 : 천원)

세목 구분		물량 (요율)	세목별 총액	F+1년 예산(안)		산출근거
				F+1년소요	F+2년이후소요	
소 계						1) 지침 내 설계/감리/부대비 요율 준용 2) 건축물이 아닌 토목, 전기공사 등과 같은 단일 공종일 경우는 규격, 수량으로 산출근거 표시 3) 단가, 할증률, 부대공사비 등 반드시 구분하여 표시 4) 지침 내 편성기준단가가 있는 경우는 기준단가로, 없는 경우는 실적·설계단가 적용 5) 여러 동일 경우 산출근거(시설명, 연면적, 층수, 동수, 구조, 단가, 예산, 산출근거)
시설 공사비	본 공사비	0동/000㎡				
	분담금	0.00%				
소 계		0.00%				
기본 조사 설계비	설계비	0.00%				
	대관협의비 (국가유산,환경, 재해 등)	0.00%				
실시설계비		0.00%				
감리비 (시공/소방/석면/통신)		0.00%				
시설부대비		0.00%				
건설보상비 (GB 보전분담금 등)		0.00%				
계						

3. 소요 산출 내역(국방 · 군사시설 기준 적용 결과)

가. 사업대상 시설(연면적, 규격, 산출내역)

나. 기존시설 철거/활용계획(시설명, 면적, 구조, 건립년도, 활용방안, 관련예산)

4. 계획부지 현황(지역시설단에 협조)

가. 부지면적 및 소유주

나. 대지이용계획(부대/기지현황도 위에 개략적인 시설 배치계획 및 설명)

다. 대관협의 사항(개발제한구역, 산지/농지전용, 환경영향평가, 재해영향성 검토 등)

라. 토지이용계획확인서(반드시 첨부)

5. 기존 시설의 사진 및 신규 시설의 조감도(보유시)

[별지 제2호 서식]

증기계획 기본요구서

1. 사업명 (예산코드 : 0000-0000-000)
2. 사용부대
3. 소요검토 부서
4. 확인내용

작성기관/담당자 (연락번호)			책임시설단					
사 업 구 분			물 량(동/ 연면적)					
사업지역 주소			부지면적					
사업부지 지목		지역/지구		제한사항				
사업예산 정보	계	기본조사 설계비 (420-01)	실시 설계비 (420-02)	시 설 비 (420-03)	감 리 비 (420-04)	시설 부대비 (420-05)	건설 보상비 (410-00)	자산 취득비 (430-01)
총사업비(천원)								
최초년도 소요예산								
2년차 이후 소요예산								
비 고								

집행기관 확인사항				
대관협의 대상여부 / 기타 확인사항	개발제한구역		국가유산지표조사	
	환경영향평가결과		사전재해영향성 검토결과	
	부대개편계획		소방감리 대상여부	
	기존시설철거 필요여부		기존시설 지정폐기물 포함여부	
	기 타 사 항			
예상문제점 (민원 참고사항 등)				

작성 사용부대 계급 : 성명 : (인)

확인 사업관리 부서장 계급 : 성명 : (인)

[별지 제3호 서식]

시설사업기본계획(안)

1. 사업현황
   - 사업개요, 추진경과

2. 공사의 목표 및 기본방향

3. 시설규모 및 면적
   - 표준안, 부대 공사계획, 실소요 종합, 시설규모, 배치계획, 방호기준 등

4. 공사예정지 여건분석
   - ㅇㅇ지역(배치계획상 주요 식별사항, 비행안전구역 높이규제, 도시계획사항 및 필지분석, 지형, 용도지역, 소유권 등)

5. 대관협의사항(시설별 인ㆍ허가 대상항목 검토)

6. 사업추진방안 및 추진일정(사업추진방식, 추진일정(전력화시기, 사업기간, 초과기간))

7. 포함된 장비, 물자, 방호시설 등의 확보방안(물품 장비소요, 확보방안)

8. 예상문제점 및 조치방안
   - 전력화 시점 대비 공사초과, 탄약고 안전거리 심의, 사업기간 연장, 공사비용 증가 등

9. 유지관리 및 환경보전계획(환경보전 대책, 에너지 효율기준 충족 등)

10. 총사업비(부대별, 공사비 항목별)

11. 통합사업관리팀 구성(안)

12. 향후 추진일정

* 시설별 세부 산출근거
* 철거시설 목록
* 부대별 세부 사업비 산출내역
* 부대별 세부 사업추진일정
* 관련기관 의견

[별지 제4호 서식]

설계기본요구조건

1. 사업개요

가. 공사명 :
나. 공사위치(지번) :
다. 시설 필요성 :
라. 계획 예산 :
마. 시설사용 요구시기 :

2. 병영기본계획서의 병영명칭 및 부대 고유 계좌번호

가. 병영명칭 :
나. 계좌번호 :

3. 요구시설 개요

가. 건축물일 경우 (※ 여러 동일 경우 전체 기록)

(단위 : 천원)

시설명	면적(㎡)	층 수	동 수	구 조	계획예산	금액(㎡당)	비고
계							

* 표준 설계도 적용 여부 명시

나. 토목, 기계설비, 옥외전기공사와 같이 단일 공종일 경우

(단위 : 천원)

공 종	내 용	규 격	수 량	계획예산	비 고
계					

4. 시설 사용부대 업무체계 및 단위편성

5. 계획시설 내 수용인원 및 장비

6. 계획부지 현황

가. 부지면적 및 소유주
나. 현재 사용용도
다. 지역, 지구 및 구역
라. 인접도로현황
마. 미군 공여구역 저촉 여부
바. 주변의 현존시설 및 계획부지 장차 발전계획
사. 간선 공급현황(상수, 전기, 도시가스, 하수 종말처리 관로 등)
아. 기타 관련법규 저촉 여부 및 특기사항
   - 개발제한지역, 접도구역, 농업진흥구역 및 비행구역 등에 대한 저촉여부와 위험물 저장시설과의 안전거리 등의 검토사항

7. 세부 요구사항

가. 대지이용계획

1) 기지현황도 위에 개략적인 시설 배치계획 및 설명
2) 주변 시설현황이 명시된 시설 배치도

나. 토목공사

1) 기존시설 현황 : 배치도에 표시
   - 급수시설 현황(현 급수방법, 공급량 및 사용인원)
   - 오·배수시설 현황

2) 요구시설 현황(구체적)

구분	시설내용	단위	규격	수량	계획예산	비고
부지조성	토공사	㎡				절·성토 및 사토 등
구조물	옹벽·석축	m				
	배수시설	m				
	공동구	m				
	암거	개소				
	교량	개소				
급수	상수인입	개소				
	물탱크	개소				
	급수관로	m				
	정수시설	개소				
	양수시설	개소				
포장	아스팔트	㎡				도로폭 및 용도
	콘크리트	㎡				
	보도	㎡				
울타리	철조망	m				
	철망	m				
	블럭담	m				
기타사항		식				
계						

다. 건축공사

1) 기존건물 면적(신설부대 제외)

시설명	지하층	1층	2층	3층	---	합계
계						

2) 요구건물별 소요 실면적 및 건축마감

(면적단위 : ㎡, 금액단위 : 천원)

시설명 :			계획예산 :			건축마감				
층	소요실	적용면적	사용인원	기준면적	소요면적	바닥	벽	천장	창호	비고
계										

※ 외부마감, 지붕 등 건물 전체에 대한 특수 요구사항 작성, 국방·군사시설기준에서 명시한 마감기준과 상이한 마감 필요시 추가 작성

3) 건물별 요구사항(※ 건물이 2동 이상일 경우에는 동별로 별도 작성)

(단위 : 천원)

건물명	공 종	내 용					계획예산
	옥내설비	난방방식	냉 방	항온항습	급 탕	가스설비	
	옥내전기	발 전 기	UPS	전등	경보기		
	약전설비	전화	인터폰	방송	TV	LAN망	

※ 사용부대 설치장비 규격, 위치, 대수, 요구사항 기술, 상기 내용 이외 특기사항 및 요구내용 기술

라. 기계설비공사

1) 기존시설 현황

- 주변 냉·난방기기 방식/ 종류/ 용량/ 부하, 위생설비 현황(수전, 급수 수압 등), 주요 장비 설치 연도 및 현상태, 소방설비 현황, 사용연료(경유, 중유, 벙커C유, 가스, 전기 등), 주변 상수압/ 기타

2) 요구시설 현황(구체적)

(단위 : 천원)

시설명	구분	요구사항	계획예산	비고
	냉 방			
	난 방			
	기 타			
계				

마. 옥외 전기설비공사

1) 기존시설 현황 : 배치도에 표시

- 수변전설비 단선결선도, 계약전력 현황 : (kW), 수전용량 현황, 월별 사용전력량, 기존 고압선로도, 신설시설 주변 기존 변압기 현황, 자가 발전기 현황, 주변 외등 현황

2) 요구시설 현황(구체적)

(단위 : 천원)

구 분	내용 및 수량	계획예산	비고
수배전시설			
배전선로			
기 타			
계			

바. 조경공사

1) 기존시설 현황

- 수림상태, 녹지현황, 조경시설물 현황, 기타

2) 요구시설 현황(구체적)

(단위 : 천원)

시설종류	시설내용	단위	규격	수량	계획예산	비고
식재	수목식재	주				
	잔디공사	㎡				
조경시설물	파고라	개				
	등의자	개				
	휴지통	개				
	기타					
기타						
계						

사. 환경시설공사

1) 기존시설 현황

- 계획부지 주변시설(필요시 도면 첨부), 지방자치단체 인접시설

2) 요구시설 현황(구체적)

(단위 : 천원)

시설명	개소	**처리용량 또는 규격**	계획예산	비고
정화조	개			
오수처리시설	개			
기 타	개			
계				

※ 환경시설 설치에 대한 특수 요구사항(지역별/시설별 시설요구기준 포함)

아. 철거 및 기타 특수 요구조건

1) 철거시설 현황

(단위 : 천원)

시 설 명	면 적	구 조	건립년도	철거예산	비 고
계					

※ 폐기물처리비 견적서 첨부(철거예산에 포함)

2) 기타 특수 요구조건

8. 사업관련 실명원

구 분	직책	계급	성명(서명 또는 인)	일자	비고
작 성 관					
시설사용(요구)부대(서)장					
확 인 관					

* 첨부서류 : 위치도 (Key Plan), 대지이용 계획도, 배치도(급수, 배수, 오수, 옥외전기, 도로 등의 인입 및 분기현황 포함), 조경계획도, 시설물 평면도, 토지이용계획확인원, 요구시설 평면도, 지적도 등본, 토지등기부등본, 토지관리대장, 건축물관리대장 (신규 건축물 제외), 건물등기부등본(신규 건축물 제외), 현장사진, 특수장비 제원 및 사양서

[별지 제5호 서식]

신규 시설사업 적정성 검토(총괄)

순번	검 토 대 상	기 준		검토결과	증빙자료
		승인	불가		
부지 소유자 관련					
1	사유지 포함여부	비포함 (사용승낙시)	포함	포함 □ 비포함 □ 포함(사용승낙) □	토지대장
2	공유지 포함여부	비포함 (사용승낙시)	포함	포함 □ 비포함 □ 포함(사용승낙) □	
국토의 계획 및 이용에 관한 법률					
3	도시계획시설 여부	비대상 (계획반영시)	대상	대상 □ 비대상 □ 대상(계획반영) □	토지이용 계획 확인원
4	자연환경보전지역 여부	비대상 (계획반영시)	대상	대상 □ 비대상 □ 대상(계획반영) □	
5	경관지구 여부	비대상 (계획반영시)	대상	대상 □ 비대상 □ 대상(계획반영) □	
6	역사문화환경보호지구 여부	비대상 (계획반영시)	대상	대상 □ 비대상 □ 대상(계획반영) □	
개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법					
7	개발제한구역 여부	비대상 (계획반영시)	대상	대상 □ 비대상 □ 대상(계획반영) □	관리계획반영 증빙문서
매장유산 보호 및 조사에 관한 법률					
8	매장유산 유존지역 여부	비대상 (계획반영시)	대상	대상 □ 비대상 □ 대상(계획반영) □	-

신규 시설사업 적정성 검토(체크리스트)

* 사업부지는 국방 인트라넷(국방시설정보체계 내 지리정보), 관련법규 저촉여부는 인터넷(토지이용규제정보서비스, 국가유산청 홈페이지 및 국가유산 공간정보서비스)에서 확인

확인사항	확인여부
Ⅰ. 부지 확인 **※ 아래 내용 모두 확인 후 1~4번은 "네", 나머지는 "아니오"인 경우만 "적정"에 체크**	**적정 □ 부적정 □** **조치중 □**
1. 사업부지 지번 및 주소는 정확히 입력하고, 부지 확인 및 관련 법규 저촉사항을 정확히 확인하였는가?	네 □ 아니오 □
2. 사업부지가 국방부 부지인가?	네 □ 아니오 □
2-1. 타부처 및 사유지일 경우 토지교환, 매입 등 협의가 되었는가? (협의 여부를 확인할 수 있는 문서가 없는 경우 "아니오"에 체크)	네 □ 아니오 □
3. 사업부지를 충분히 확보할만큼 가용공간이 있는가?	네 □ 아니오 □
4. 신축예정부지가 「국방탄약 및 폭발물 안전관리훈령」에 따른 탄약안전거리를 충분히 확보하고 있는가?	네 □ 아니오 □
5. 사업부지 토지이용계획상 구거가 있는가?	네 □ 아니오 □
6. 토지이용계획상 접도구역인가?	네 □ 아니오 □
7. 5층 이상 건물을 건축할 부지의 용도지역이 계획관리지역인가?	네 □ 아니오 □
8. 토지이용계획상 근린공원으로 지정되었는가?	네 □ 아니오 □
9. 용도지역이 자연환경보전지역으로 국립공원에 해당되는가?	네 □ 아니오 □
10. 관사를 건축할 용도지역이 수변구역인가?	네 □ 아니오 □
11. 용도지역이 공익용산지, 보전산지인가?	네 □ 아니오 □
12. 사업부지가 국유림에 해당되는가?	네 □ 아니오 □
12-1. 건축행위 관련 산림청과 협의가 되었는가? (협의 여부를 확인할 수 있는 문서가 없는 경우 "아니오"에 체크)	네 □ 아니오 □
13. 용도지역이 과밀지역인가?	네 □ 아니오 □
14. 용도지역이 철도구역인가?	네 □ 아니오 □
15. 용도지역이 도로구역인가?	네 □ 아니오 □
16. 용도구역이 역사문화 환경보전구역인가?	네 □ 아니오 □
17. 용도구역이 소하천 구역인가?	네 □ 아니오 □
18. 용도구역이 완충녹지, 소로1류인가?	네 □ 아니오 □
19. 용도지역이 전용공업지역인가?	네 □ 아니오 □

확인사항	확인여부
Ⅱ. 개발제한구역 **※ 1번이 "아니오" 또는 2~3번이 "네"인 경우만 "적정"에 체크**	**적정 □ 부적정 □ 조치중 □**
1. 토지이용계획확인원상 부지가 개발제한구역에 해당되는가?	네 □ 아니오 □
2. 사업내용이 개발제한구역 관리계획에 반영되었는가?	네 □ 아니오 □
3. 사업내용이 기반영된 관리계획과 일치하는가?	네 □ 아니오 □
3-1. 경미한 변경일 경우 지자체의 승인을 받았는가? (협의 여부를 확인할 수 있는 지자체 승인 예정공문 등이 없는 경우 "아니오"에 체크)	네 □ 아니오 □
Ⅲ. 대관협의 **※ 1~3번 모두 "아니오"인 경우만 "적정"에 체크**	**적정 □ 조치필요 □**
1. 사업부지가 토지이용계획원상 통제보호구역에 해당되는가?	네 □ 아니오 □
1-1. 통제보호구역에 해당될 경우 군사기지및군사시설보호심의위원회 심의를 받았는가?	네 □ 아니오 □
2. 부지의 용도지역별 건축물에 대한 건폐율과 용적률을 초과하는가?	네 □ 아니오 □
3. 부지의 용도구역이 비행안전구역에 해당되는가?	네 □ 아니오 □
3-1. 비행안전구역일 경우 비행안전구역심의를 받았는가?	네 □ 아니오 □
4. 국가유산 보존영향 검토 대상구역에 해당되는가? * 토지이용규제 정보서비스 조회 및 관할 지자체 문의	네 □ 아니오 □
5. 매장유산 유존지역에 해당되는가? * 국가유산 공간정보서비스 조회 및 관할 지자체 문의	네 □ 아니오 □
Ⅳ. 사전절차 **※ 1~7번은 "네", 8~10번은 "아니오"인 경우만 "적정"에 체크**	**적정 □ 조치필요 □**
1. 상수도, 오수관로, 도시가스 인입사업의 경우 지자체 및 관련 기관 협의가 완료되었는가?	네 □ 아니오 □
2. 개수, 증축 사업의 경우 기존건물에 대한 안전진단·내진성능 평가를 실시하였는가?	네 □ 아니오 □
3. GOP 등 미확인 지뢰지대 내 사업인 경우 사전 지뢰제거작전을 완료하였는가?	네 □ 아니오 □
4. 심정신축 사업인 경우 수맥탐사를 완료하였는가?	네 □ 아니오 □
4-1. 수맥탐사가 사업시행연도 전반기 내 완료될 수 있도록 계획에 반영되었는가?	네 □ 아니오 □
5. 건축승인 대상사업일 경우 기존건물 또는 동일지번 내 건축물이 건축물 대장에 등재되어 있는가?	네 □ 아니오 □
6. 사업부지 내 기존시설물을 철거하는 경우,「군 시설사업 관리훈령」 제62조 및 별표21에 따라 철거 가능한 건축물인가?	네 □ 아니오 □
7. 주요군사시설 방호기준 적용 대상 사업의 경우,「국방·군사시설 기준 2-20-00 주요군사시설 방호기준」을 준수하였는가?	네 □ 아니오 □
8. 사업부지 내 이장할 분묘가 있는가?	네 □ 아니오 □
9. 부대개편사업 또는 BTL 사업으로 이미 건축되었거나 향후 계획에 반영된 사업인가?	네 □ 아니오 □
10. 대보수 또는 재투자 사업으로 이미 개선된 사업인가?	네 □ 아니오 □
Ⅴ. 민원/소송 **※ 1번이 "아니오"인 경우만 "적정"에 체크**	**적정 □ 조치필요 □**
1. 공법 또는 업체 간 다툼으로 민원 또는 소송이 진행되고 있는 사업인가?	네 □ 아니오 □

확인사항	확인여부
Ⅵ. 예산 **※ 1~12번 모두 "네"인 경우만 "적정"에 체크**	**적정 □ 조치필요 □**
1. 총사업비 200억 원 이상(토목공사는 300억 원 이상) 사업인 경우 사전·사업타당성 조사를 완료하거나 면제 받았는가?	네 □ 아니오 □
2. 예산편성지침에 따른 편성단가를 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
3. 국방·군사시설기준에 따른 적정 면적을 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
3-1. 해당 부대는 부대 개편 또는 편제 변경이 계획되어 있는가?	네 □ 아니오 □
3-2. 적정 면적 계산시 시설물을 실제로 이용할 미래편제를 고려하였는가?	네 □ 아니오 □
4. 관사, 간부숙소 등 공용면적을 정확히 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
5. 녹색건축물 조성지원법 제17조에 따라 제로에너지인증제 시행에 따른 예산을 반영하였는가? * 제로에너지 인증제 적용 대상 국방부가 소유 또는 관리하는 건축물로써, 30세대 이상의 공동주택 또는 연면적이 500㎡이상인 공동주택 외의 건축물을 신축·재축 또는 증축(별동)하는 경우	네 □ 아니오 □
6. 부지의 용도지역이 보전관리지역이고 사업면적 5천㎡ 이상, 2km이상 토목공사일 경우 사전재해영향성 검토 및 환경영향평가 예산을 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
7. 국가유산 보존영향검토 대상구역으로 국가유산 조사 비용을 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
8. 사업부지 내 기존시설물 철거에 대한 공사비를 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
9. 철거시설물 중 석면(텍스, 슬레이트 등) 포함 시설물에 대한 석면 철거 및 지정폐기물 처리비를 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
10. 내진평가 결과 현 건물 개수시 내진보강이 필요한 경우 내진 보강비용을 반영하였는가?	네 □ 아니오 □
11. GB관리구역 내 사업인 경우 보전부담금을 반영하였는가? * 착공 전 반영 필요	네 □ 아니오 □
12. 주요군사시설 방호기준 적용 대상 사업의 경우, 적정 사업예산(공사비, 방폭 시뮬레이션 비용)을 반영하였는가?	네 □ 아니오 □

부대명	*작성관이 속한 부대까지 정확히 작성*
계급/성명	
연락처1(군번호)	
연락처2(핸드폰)	
작성일	
